ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျောက်တန်းမြို့

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း

(VDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

သုခအောင်ကျေးရွာ ၊ မရမ်းဘေးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ ၂၆ ရက် ကျောက်တန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ 3

၂။မရမ်းဘေးကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ 6

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ 7

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 7

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 10

၆။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ 19

၈။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 22

၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း 24

၁၀ ။ပုံစံစ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 26

၁၁။ ပုံစံ စ ၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား 30

၁၂။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 32

၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် 35

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တန်းများ 37

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) 41

၂၀၂၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ ( ) ရက်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ	
		မှ	ထိ
၁	စကားချီး	၂	၃
၂	ကျေးရွာ၏ သယံဇာတပြမြေပုံ	၄	၄
၃	ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်		
၄	ကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ		
အပိုင်း(၁)			
ကျေးရွာ၏လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေနှင့် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ			
၅	တည်နေရာနှင့် ပထဝီအနေအထား		
၆	ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ		
၇	ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေ		
၈	စီးပွားရေးနှင့် အသက်မွေးမှုအခြေအနေ		
	(က) သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး		
	(ခ) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း		
	(ဂ) ငါးလုပ်ငန်း		
	(ဃ) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးမဟုတ်သောအခြားဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ		
	(င) ဘဏ်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု		
၉	အခြေခံအဆောက်အဦနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ		
၁၀	ပညာရေး		
၁၁	ကျန်းမာရေး		
၁၂	ဘေးအန္တရာယ်များနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး		
၁၃	ကျား-မရေးရာ		
၁၄	ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မည့် အဆိုပြုစီမံချက်လုပ်ငန်းများ		
အပိုင်း(၂)			
စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ			
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း		
၁၆	စီမံချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ		
နောက်ဆက်တွဲများ			
၁၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုဇယားများ		

၁၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဗျူဟာတည်ဆောက်မှု အခြေပြဇယား		

စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

စီမံချက်အဆိုပြုလွှာ (သို့) စီမံချက်အကြောင်းအရာ (Project Profile)

ကျေးရွာ - သုခအောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု - မရမ်းဘေးကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် - ကျောက်တန်းမြို့နယ် တိုင်း/ပြည်နယ် - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
စီမံချက်အမည် - ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၂၀၃၀' x ၃' x ၆")
စီမံချက်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် (သို့) လက်ရှိအခြေအနေ ကျေးရွာအဝင်လမ်းမှာ ၃' ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်နေပါသဖြင့် လက်ရှိလမ်းဘေးတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
စီမံချက်ရည်ရွယ်ချက် (လက်ရှိအခြေအနေအား ပိုကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ဆန္ဒဖော်ပြရန်) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမို ကောင်းမွန်လာပြီး လူမှုဘဝတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။
မျှော်မှန်းအကျိုးရလဒ် (လက်ငင်းရည်ရွယ်ချက် ရောက်ရှိပြီး နောက်ထပ်ဆင့်ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပိုမို ကောင်းမွန်လာပြီး လူမှုဘဝတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျန်ရှိသော လမ်းပိုင်းများအား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
စီမံချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြခြင်း (ဘာလုပ်မည်၊ ဘယ်လောက် ပမာဏ လုပ်ရမည်) သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန၏ ထောက်ပံ့ငွေ၊ နည်းပညာအကူအညီနှင့် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ လုပ်အား၊ထည့်ဝင်ငွေများဖြင့် လုပ်ငန်းအား အရည်အသွေးပြည့်မီစွာနှင့် သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းအား အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်သွားမည်။

စီမံချက်ကုန်ကျစရိတ်ထည့်ဝင်မှု	
ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် - (၁၅.၀) ကျပ်သန်း	ပြည်သူ့ထည့်ဝင်ငွေ - (၀.၁၅) ကျပ်သန်း

၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ

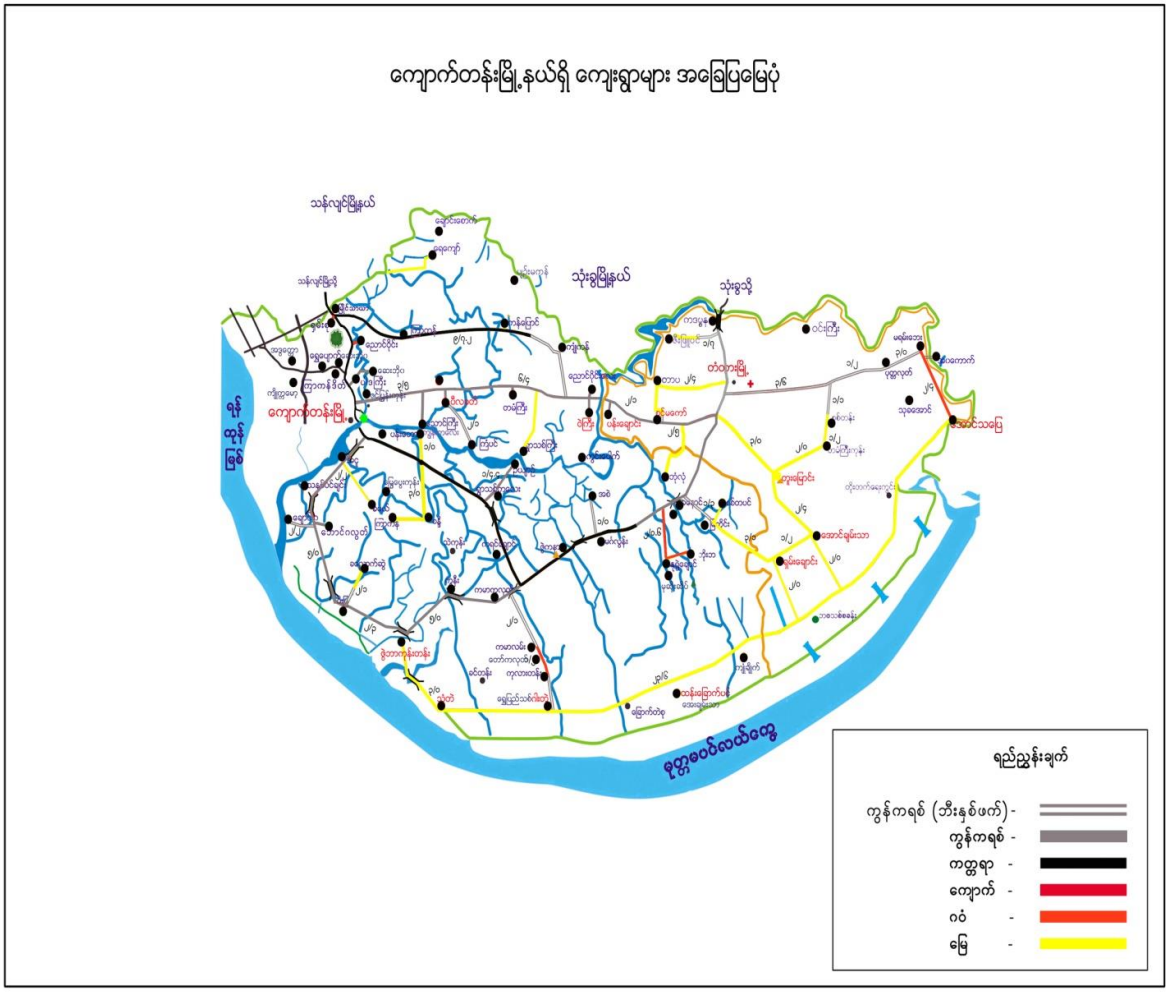

၂။မရမ်းဘေးကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၁။မရမ်းဘေးကျေးရွာ

၂။သုခအောင်ကျေးရွာ

၃။အဝကောက်ကျေးရွာ

၄။အောင်သပြေကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သုခအောင်ကျေးရွာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် (၂၅) မိုင်ခန့်ကွာဝေးသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ သုခအောင်ကျေးရွာဟုအမည်မပေါက်မီ ၁၉၇၁ ခုနှစ်က အထက်မငေးအမည်ဖြင့် ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် ။အိမ်ထောင်စု(၅၀)စု ခန့်ရှိပြီးလူဦးရေ (၂၁၀)ဦးရှိကာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက်လည်း ရေလမ်းခရီးကိုသာ အဓိကအသုံးပြုရပါသည်။ကျေးရွာ၏ သက်တမ်းမှာနှစ်ပေါင်း (၄၆)နှစ် ကျော်ခန့်ကြာမြင့်သည်ဟု လူကြီးများပြောကြားသော မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ အရသိရှိရပါသည်။

ကျေးရွာတွင်အခြေခံအဆောင်အအုံအနေဖြင့် မူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပြီး အလျားပေ ၆၀ ၊အနံပေ ၃၀ ဖြင့်သွပ်မိုး တိုက်ခံကျောင်းအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် အထက်မငေးကျေးရွာမှ သုခအောင်ကျေးရွာသို့ပြောင်းလဲခေါ်တွင်ခဲ့ကာ ပြည်ထဲရေးအမည်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၄)အိမ်ထောင်စုနှင့်၊ လူဦးရေ (၃၄၅) ယောက်ထိ တိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ လက်လုပ်လက်စားနှင့် စာရင်းဌား အလုပ်ကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရှိပြီး အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့များ ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အဓိကအလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအဓိကထားကိုးကွယ်ပြီး ဘာသာတရား ကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းပြီး အမျိုးသားအမျိုးသမီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီ လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုစာရင်း

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၇၄	၁၂၂	၁၉၉	၂၄၁
ဟိန္နူ	၁၀	၅၃	၅၁	၁၀၄

၃။ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၈	၁၀	၈	၁၈
မြေယာမဲ့	-	-	-	-
မသန်စွမ်း				

၄။အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	နိုင်ငံခြားသွား
ပဲတီစိမ်း	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	
	ဆိတ်	ဈေးဆိုင်	
	ဘဲ၊ငါး	စပါးရိတ်စက်	

၅။ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	ဥယျာဉ်မြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၉၅၀ဧက	၀	၀	၀	၁၀	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာကျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ခြွေလှေ့စက်	လယ်ယာသုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၀	၃	၀	၁/၁	၃	၅

၆။ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၀	၂၃	၁၇	၁၀	၃၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄၃	၁၅	၁၂	၈၉	၅

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၁၄-၁၀-၂၀၂၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇	၁၁	၁၈	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်းရေကန်များ၊သစ်တောများ
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်	၁၄-၁၀-၂၀၂၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၇	၆	၁၃	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့်ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၄-၁၀-၂၀၂၀	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၆	၉	၁၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်	၁၄-၁၀-၂၀၂၀	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၇	၉	၁၆	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်	၁၄-၁၀-၂၀၂၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၆	၇	၁၃	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄-၁၀-၂၀၂၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၀	၁၄	၂၄	ကျေးရွာတွင်းရှိပိုင်ဆိုင်ထားသောအရင်းအမြစ်များအားသိရှိခြင်း

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

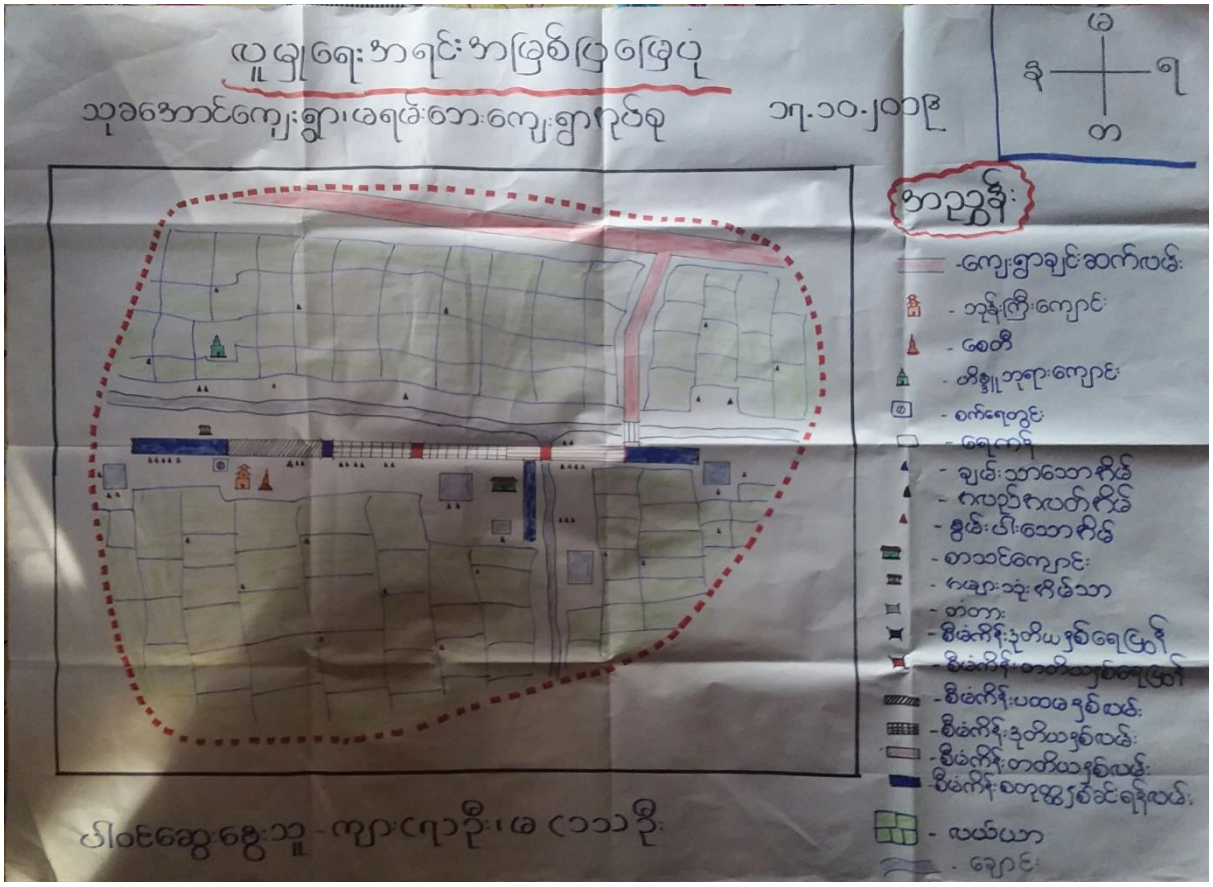

သုံးသပ်ချက်

သုခအောင်ကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး ဟိန္ဒူလူမျိုးလည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ လူဦးရေမှာ(၃၄၅)ရှိပြီး ဗမာအိမ်ထောင်စု(၇၄)စု၊ ဟိန္ဒူအိမ်ထောင်စု(၁၀)စုရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး မွေးမြူရေးကို တနိုင်တပိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် စပါးနှင့်ပဲကိုသာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ မွေးမြူရေးတွင် ဝက်၊ ကြက်၊ ဘဲ၊ ဆိတ်တို့ကို သာမွေးမြူကြပါသည် ။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာရရှိပါသည်။ စာသင်ကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ စေတီ နှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ ပထမနှစ်၊ဒုတိယနှစ်များတွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကို ခင်းခဲ့ပြီး ယခုနှစ်တွင်လည်း ကျန်ရှိနေသော ကျေးရွာတွင်းလမ်းကို ဆက်လက်ခင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

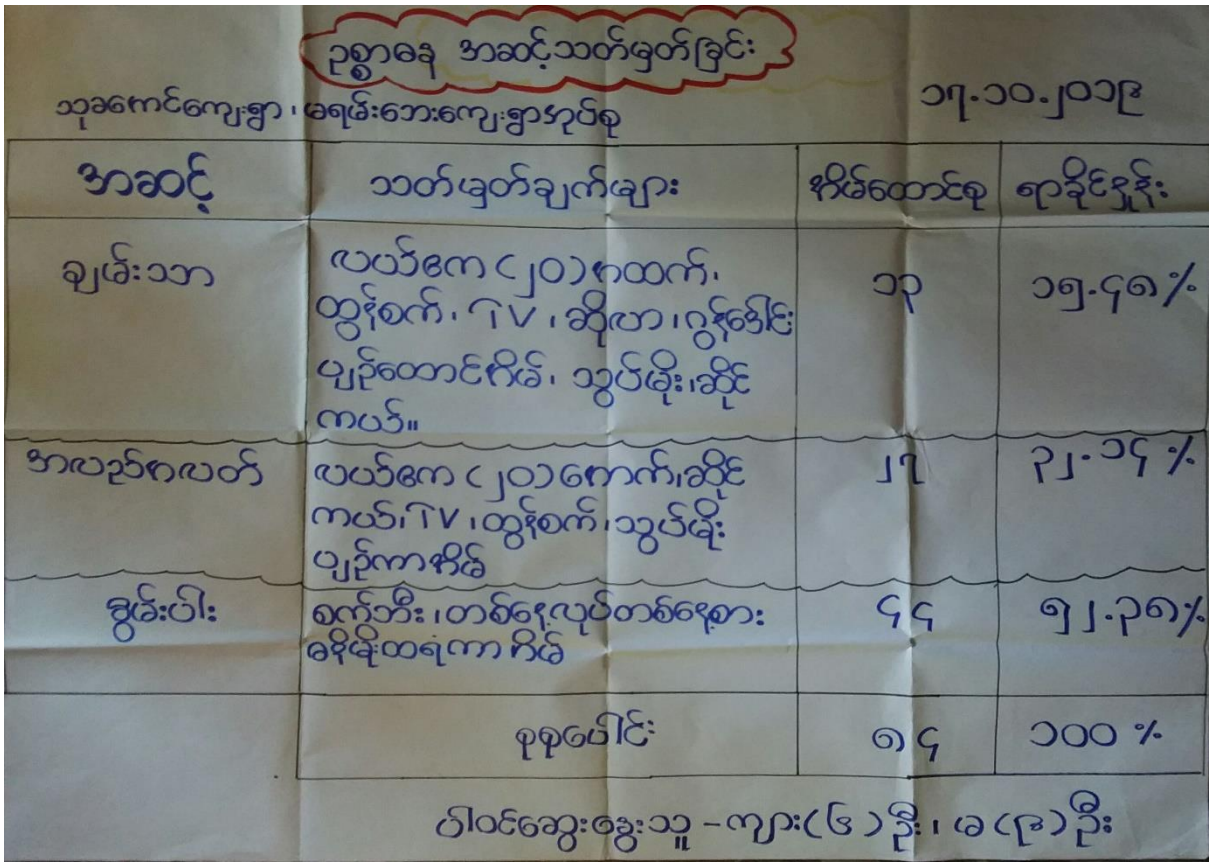

ဥစ္စာဓန အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

သုခကောင်ကျေးရွာ ၊ ဓရဖိုးဘားကျေးရွာအုပ်စု ၁၇.၁၀.၂၀၁၉

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက ၂၀ ကထက်၊ တွဲစက်၊ TV၊ ဆိုလာ၊ ဂွန်ဒေါင်း ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ဆိုင်ကယ်။	၁၃	၁၅.၄၈%
အလယ်အလတ်	လယ်ဧက ၂၀ ကျော်၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ တွဲစက်၊ သွပ်မိုး ပျဉ်ကာအိမ်	၂၇	၃၂.၁၄%
ချမ်းပါး	စက်ဘီး၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား၊ ခရိုမိုးထရံကာအိမ်	၄၄	၅၂.၃၈%
	စုစုပေါင်း	၈၄	၁၀၀%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၆)ဦး၊ မ(၃)ဦး

သုံးသပ်ချက်

သုခအောင်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ၊ အလည်အလတ်၊ နွမ်းပါးဟူ၍ အဆင့်(၃)ဆင့် ပိုင်းခြားထားပါသည်။ ချမ်းသာသောသူများသည် လယ်ဧက(၂၀)အထက်၊ ထွန်စက်၊ တီဗွီ၊ ဆိုလာ၊ ဝွန်ဒေါင်း၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စု(၁၃)စုရှိပြီး အလည်အလတ်ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုများသည် လယ်ဧက(၂၀)အောက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ၊ ထွန်စက်၊ သွပ်မိုး ပျဉ်ကာအိမ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ(၂၇)စုရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများသည် စက်ဘီး၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား၊ ခနိမိုးထရံကာအိမ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ(၄၄)စုရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း နွမ်းပါးသူပေါများရခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်နှင့်သုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လများတွင် နေသာပြီး နယုန်လတွင် တိမ်ထူထပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလမှ မိုးစတင်ရွာသွန်းပြီး သီတင်းကျွတ်လထိရွာသွန်းပါသည်။ ကျန်လများတွင် နှင်းများကျပြီးရာသီဥတု သာယာပါသည်။

ပွဲတော် တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လများတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဆီမီးပူဇော်ပွဲများကျင်းပကြပါသည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ဘုရားပွဲတော်များကျင်းပကြပါသည်။

စပါးစိုက်ပျိုးရေး ကဆုန်လတွင် လယ်ယာမြေများကို စတင်ထွန်ယက်ပြီး နယုန်လတွင် စပါးကိုစတင် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် စပါးကိုရိတ်သိမ်းကြ ပါသည်.။

ပဲစိုက်ပျိုးရေး တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပဲကို စတင်မျိုးချစိုက်ပျိုးပါသည်။ တပို့တွဲလများတွင် ပဲများကိုပြန်လည်ခူးဆွတ်ကြပါသည်။

မွေးမြူရေး ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် ကြက်ကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်မွေးမြူကြပါသည်။ ထို့ပြင်ဝက်ကို ပြာသိုလမှ တပေါင်းလထိ မွေမြူကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး တော်သလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လနှင့် နတော်လများသည် ရာသီအကူးအပြောင်းကာလများဖြစ်၍ ဖျားနာတတ်ပါသည်။

သောက်သုံးရေ တပေါင်းလနှင့် တခူးလများတွင် နေအပူချိန်ပြင်းထန်သောကြောင့် သောက်သုံးရေများရှားပါပြီး ကျန်လများတွင် သောက်သုံးရေပေါများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေ သီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်သော သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ဝင်ငွေပေါများပြီး ကျန်လများတွင် နေ့စားလုပ်ကိုင်သောကြောင့် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရရှိပါသည်။

ရောင်းဝယ်ရေး တပေါင်း၊ တန်ခူးလများတွင် ရာသီချိန်သီးနှံဖြစ်သော ပဲကို ရောင်းဝယ်ကြပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် နတော်လများတွင် စပါးကိုရောင်းဝယ်ကြပါသည်။

၄။ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်။

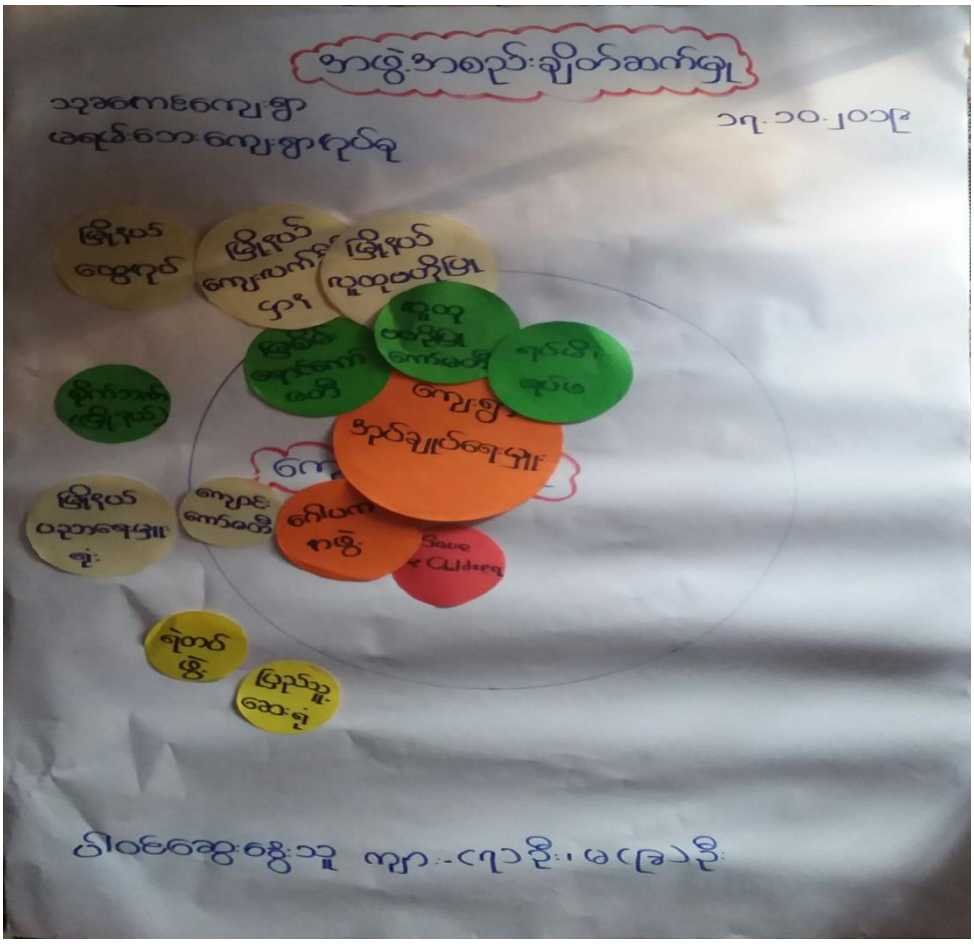

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မိဘဆရာအသင်း၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြစိမ်းရောင်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာအတွက် အရင်းအနှီးများပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပတွင် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊ မြေစာရင်းဌာန၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်တို့သည် ကျေးရွာအတွင်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပညာရေးဌာနသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူထုဗဟိုပြုကော်မတီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်။

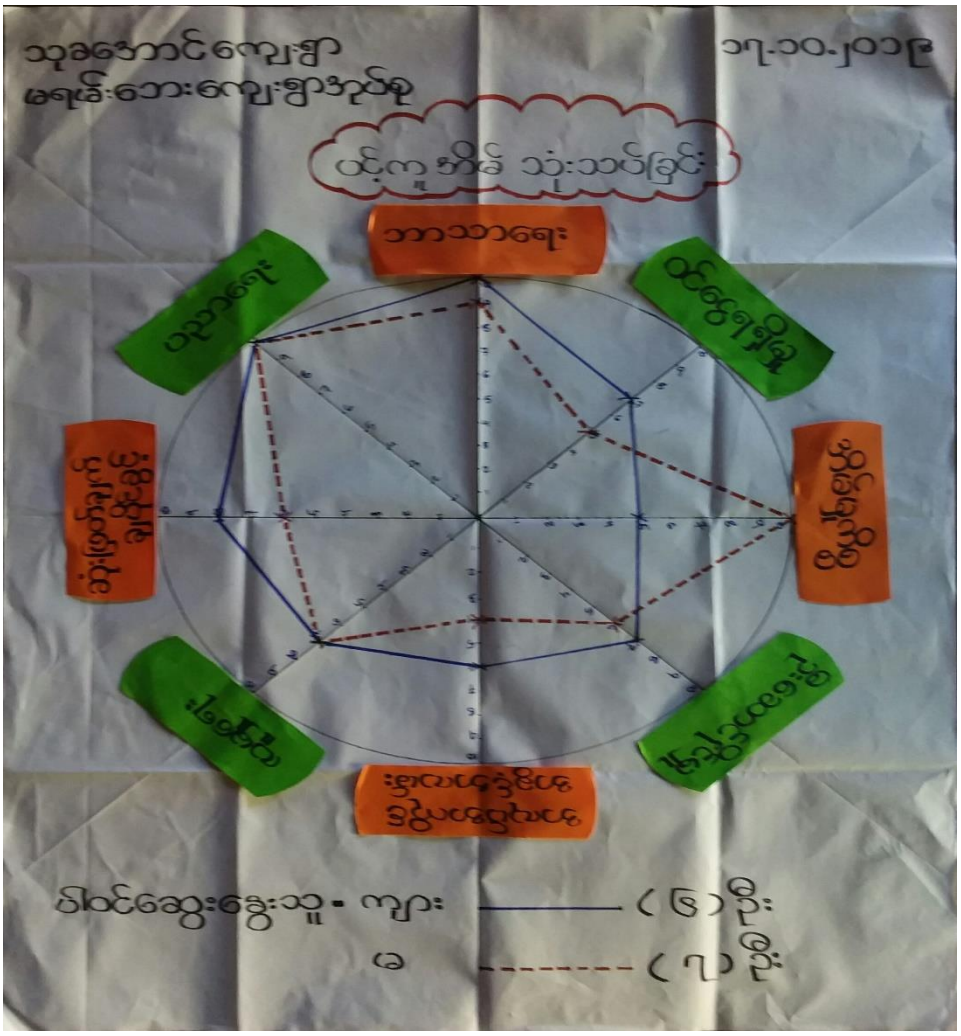

သုံးသပ်ချက်

ဘာသာရေး အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာများအရ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မှုမှာ နည်းပါးပြီး အမျိုးသားများကသာ ဦးဆောင်ပြီး ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကြောင့် အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်မလုပ်ကိုင်နိုင်သဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ပြင်ပလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ပြီး ဝင်ငွေပိုများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာများကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စများကို အမျိုးသားများထက် ပို၍လုပ်ကိုင်နေရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး အစရှိသည်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာ မြန်မာထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက ပိုများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အမျိုးသမီးများအတွက်ဝင်ငွေရသော ကျေးရွာအတွင်းလုပ်ငန်းများမှာ နည်းပါးပြီး အမျိုးသားများအတွက် ဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းများ ပေါများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

လူမှုရေး အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးကိစ္စများတွင် တန်းတူပါဝင်လုပ်ကိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ပိုရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာရေး ကျေးရွာအတွင်းတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသားများသည် ပညာသင်ကြားခွင့် တန်းတူရရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆။ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

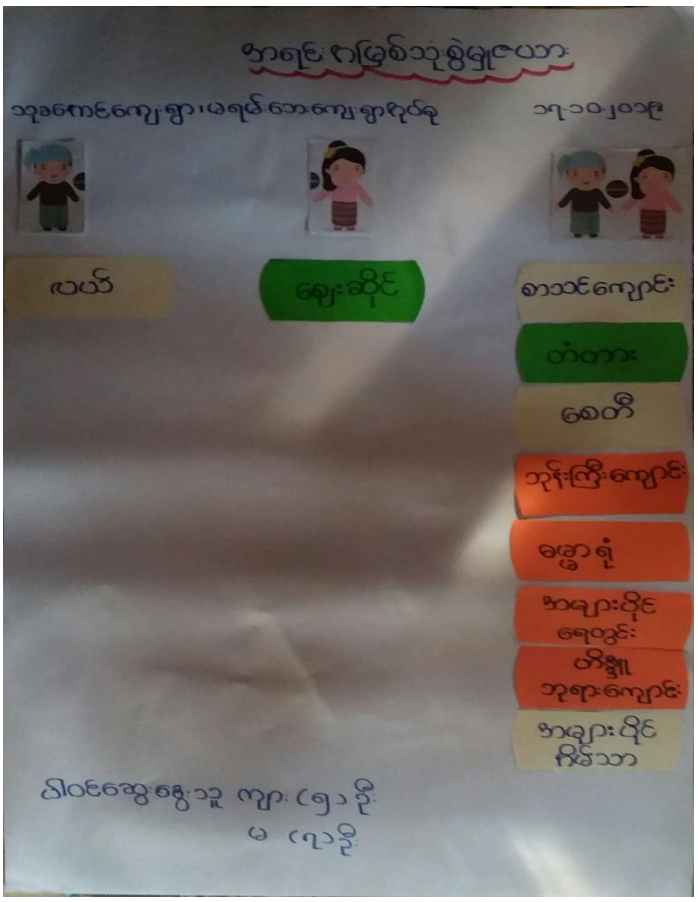

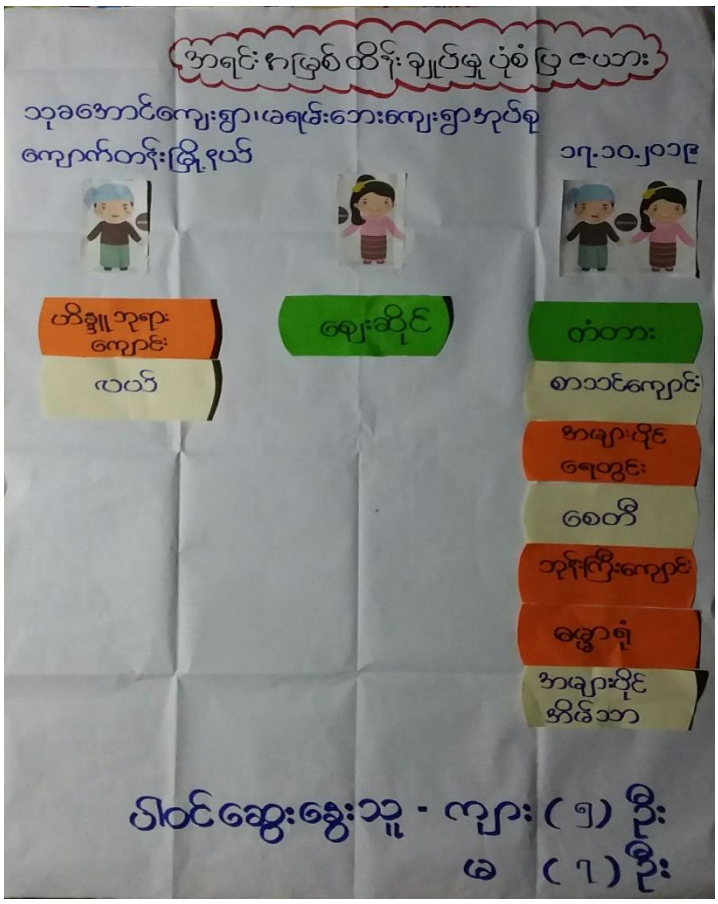

သုံးသပ်ချက်

အသုံးပြုမှု

ကျေးရွာ၏အရင်းများဖြစ်သော လယ်ကို အမျိုးသားများက အများဆုံးအသုံးပြုပြီး စျေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီးများက အများဆုံးအသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ စာသင်ကျောင်း၊ တံတား၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မဏ္ဍာရုံ၊ အများပိုင်ရေတွင်း၊ ဟိန္နူဘုရားကျောင်း၊ အများပိုင်အိမ်သာတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးက အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ထိန်းချုပ်မှု

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ဟိန္နူဘုရားကျောင်း၊ လယ်တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပြီး စျေးဆိုင်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ တံတား၊ စာသင်ကျောင်း၊ အများပိုင်အိမ်သာ၊ အများပိုင်ရေတွင်း၊ စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မဏ္ဍာရုံတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးက ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောအထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ။ ရက်စွဲ - ၁၇.၁၀.၂၀၁၉

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		√	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအားကျား၊မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	√		
၂	စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	√		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	√		
၄	အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	√		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၆	အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	√		
၇	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။	√		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	√		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကိုသင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	√		
၁၀	အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများရှိပါသလား။	√		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	√		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ (၅၀း၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ **မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။**	√		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။**မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။**	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ **မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။**	√		

၈။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံ။



လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲသည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မစတင်မီ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးခိုင်လွင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၂	ဒေါ်ဇင်မာသိမ့်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးျမင့်ၖလြင့်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးမြင့်သန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊
၅	ဒေါ်အေးလွင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးဝင်းထွန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်တင်မော်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးလှိုင်ဝင်း	ကျား	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်အေး	မ	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးမြင့်ဝေ	ကျား	ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၁	ဒေါ်အေးစန်း	မ	ဂေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၂	ဒေငှတင္ဇာဃှက်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးေဇာ့ဝမ့း	က်ား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်သဲမာဦး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၄) ယောက် ကျား-(၇)ယောက်+မ- (၇) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	လိင်		တာဝန်	မှတ်ချက်
		ကျား	မ		
၁	ဦးနိုင်ဝင်း	√		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	
၂	ဒေါ်အေးမူ		√	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	
၃	ဦးသန်းဇော်	√		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	
၄	ဒေါ်အေးအေးမြင့်		√	စာရင်းကိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	
၅	ဒေါ်ဇင်မာသိမ့်		√	အဖွဲ့ဝင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	
၆	ဦးအောင်မျိုးဦး	√		အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	
၇	ဒေါ်အေးသူဇာ		√	အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	
၈	ဦးခိုင်လွင်	√		အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဦးအောင်ဖြိုးကျော်

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၀ ။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်

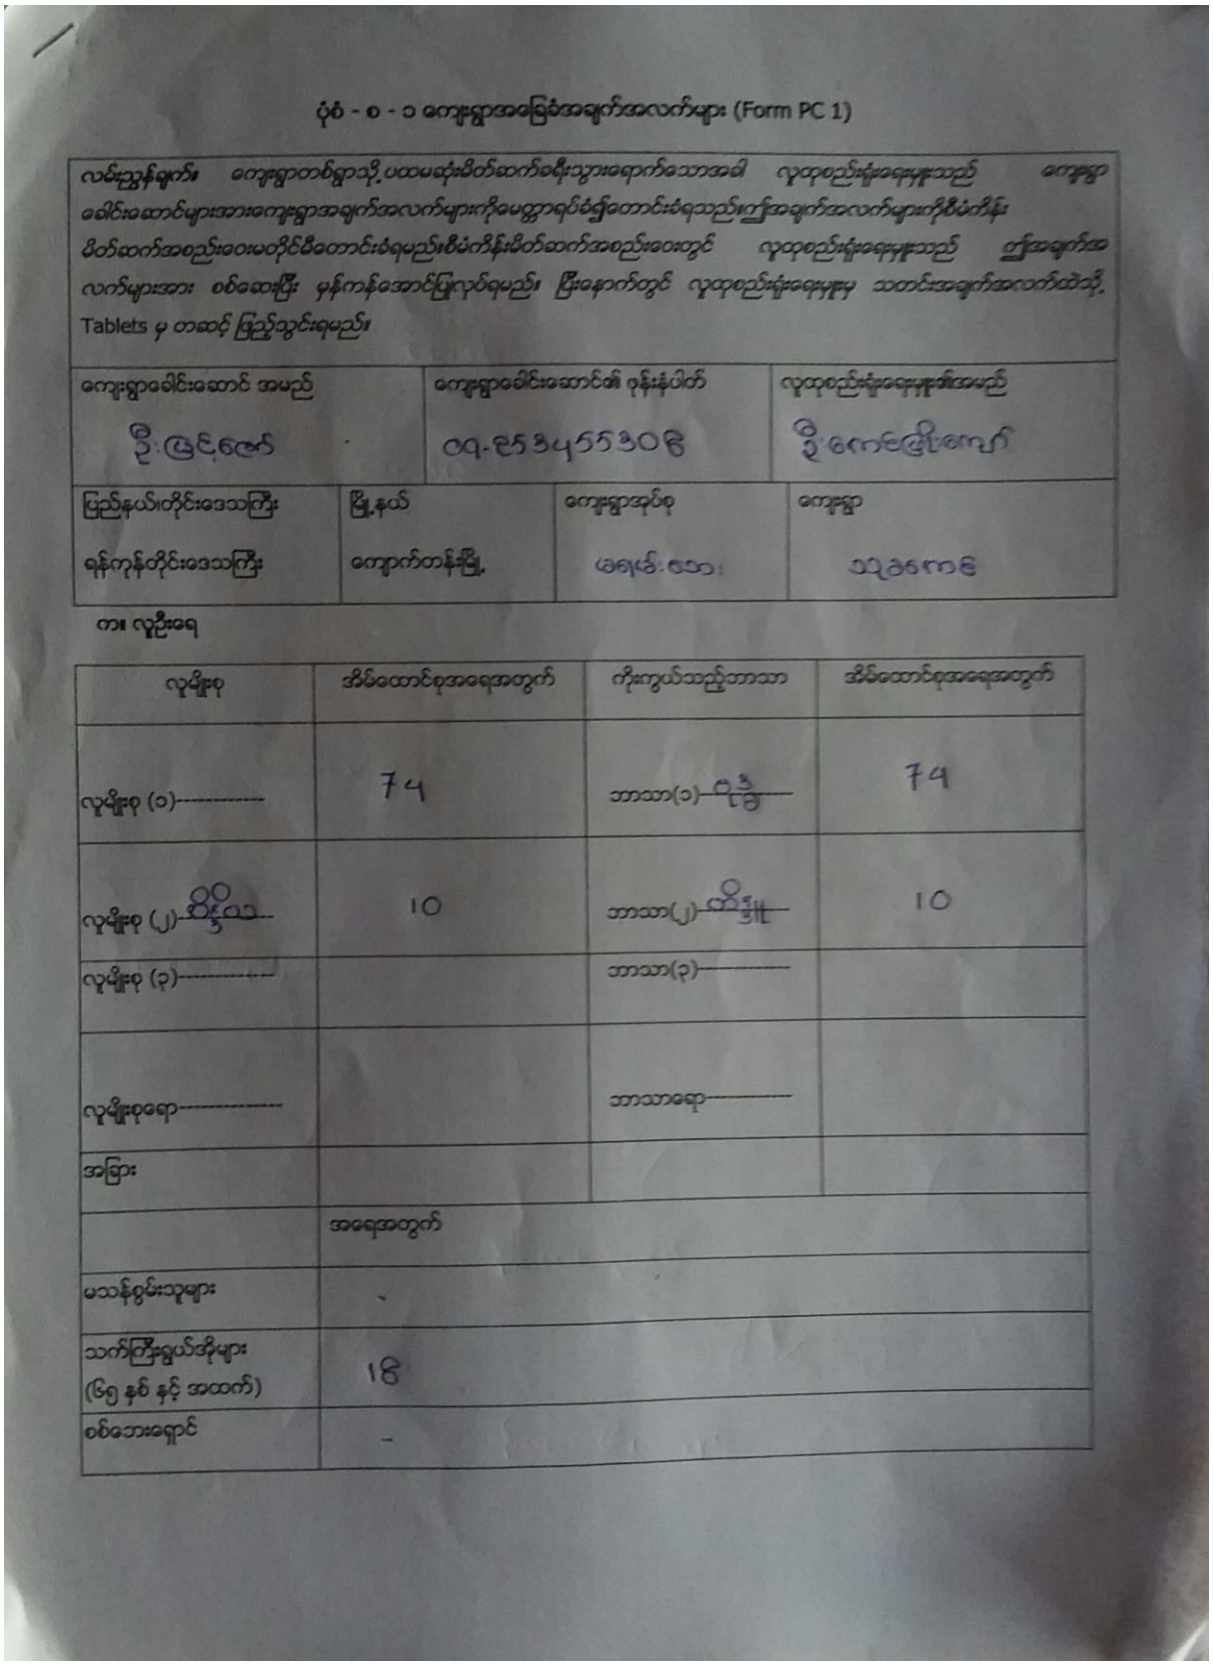

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စီးသွားစောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံခြံတောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးစောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်၊

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ဦး ဖြင့်စော်	၀၅-၉၅၃၄၅၅၁၀၆	ဦး ကောင်ဖြိုးကျော်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ကျောက်တန်းမြို့	ဖရဖိ၁ဝ၁	သဉ၁၈၈၆

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----------	74	ဘာသာ(၁)-~~ဂုဒ္ဓ~~---	74
လူမျိုးစု (၂)-~~စိန်ဝ~~---	10	ဘာသာ(၂)-~~ကသိုဏ်း~~---	10
လူမျိုးစု (၃)----------		ဘာသာ(၃)----------	
လူမျိုးစုရော----------		ဘာသာရော----------	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	18		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	175	170	345
လူမျိုးစု (၁)————	122	119	241
လူမျိုးစု (၂)-ဂိန္ဒိယ	53	51	104
လူမျိုးစု (၃)————			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	53	31	84

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး		အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ		အမှတ်ခြစ်ပါ
	အထက်တန်းကျောင်း	☐		ဆေးရုံ	☐		စေတီ	☑
	အလယ်တန်းကျောင်း	☐		ကျန်းမာရေးဌာန	☐		ဘုန်းကြီးကျောင်း	☑
	မူလတန်းကျောင်း	☑		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	☐		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	☐
	မူကြိုကျောင်း	☐		ဆေးပေးခန်း	☐		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	☐
	အခြား	☐		အခြား	☐		ဗလီ	☐
							အခြား	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	☑	☑	ဆရာဝန်	☐	☐	လက်သမား	☑	☐
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	☐	☐	ပန်းရံ	☑	☐
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	☐	☐	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	☐	☐	လျှပ်စစ်ကျမ်းကျင်၊ မီးသမား	☐	☐
မူကြိုဆရာ/မ	☐	☐	သားဖွားဆရာမ	☐	☐	ရေပိုက်သွယ်သူ	☐	☐
အခြား	☐	☐	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	☐	☐	စက်ပြင်ဆရာ	☑	☐
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၄င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(c) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/(မရှိပါ)/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်--------/မသိပါ

(၃)ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအာဏာပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးဝိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-------/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----၀၀:၃၀----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----၀၀:၄၀----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား ----------

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရောက်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□မရှိပါ ☑ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖေါ်ပြပါ----ရေဝင်----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----ဖွံ့ဖြိုးရေးရောင်----

(၂) ----------

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□မရှိပါ □ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကောင်လတ်

လက်မှတ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးကောင်ကျော်

လက်မှတ် နေ.ဖွဲ

၁၁။ ပုံစံ စ ၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား

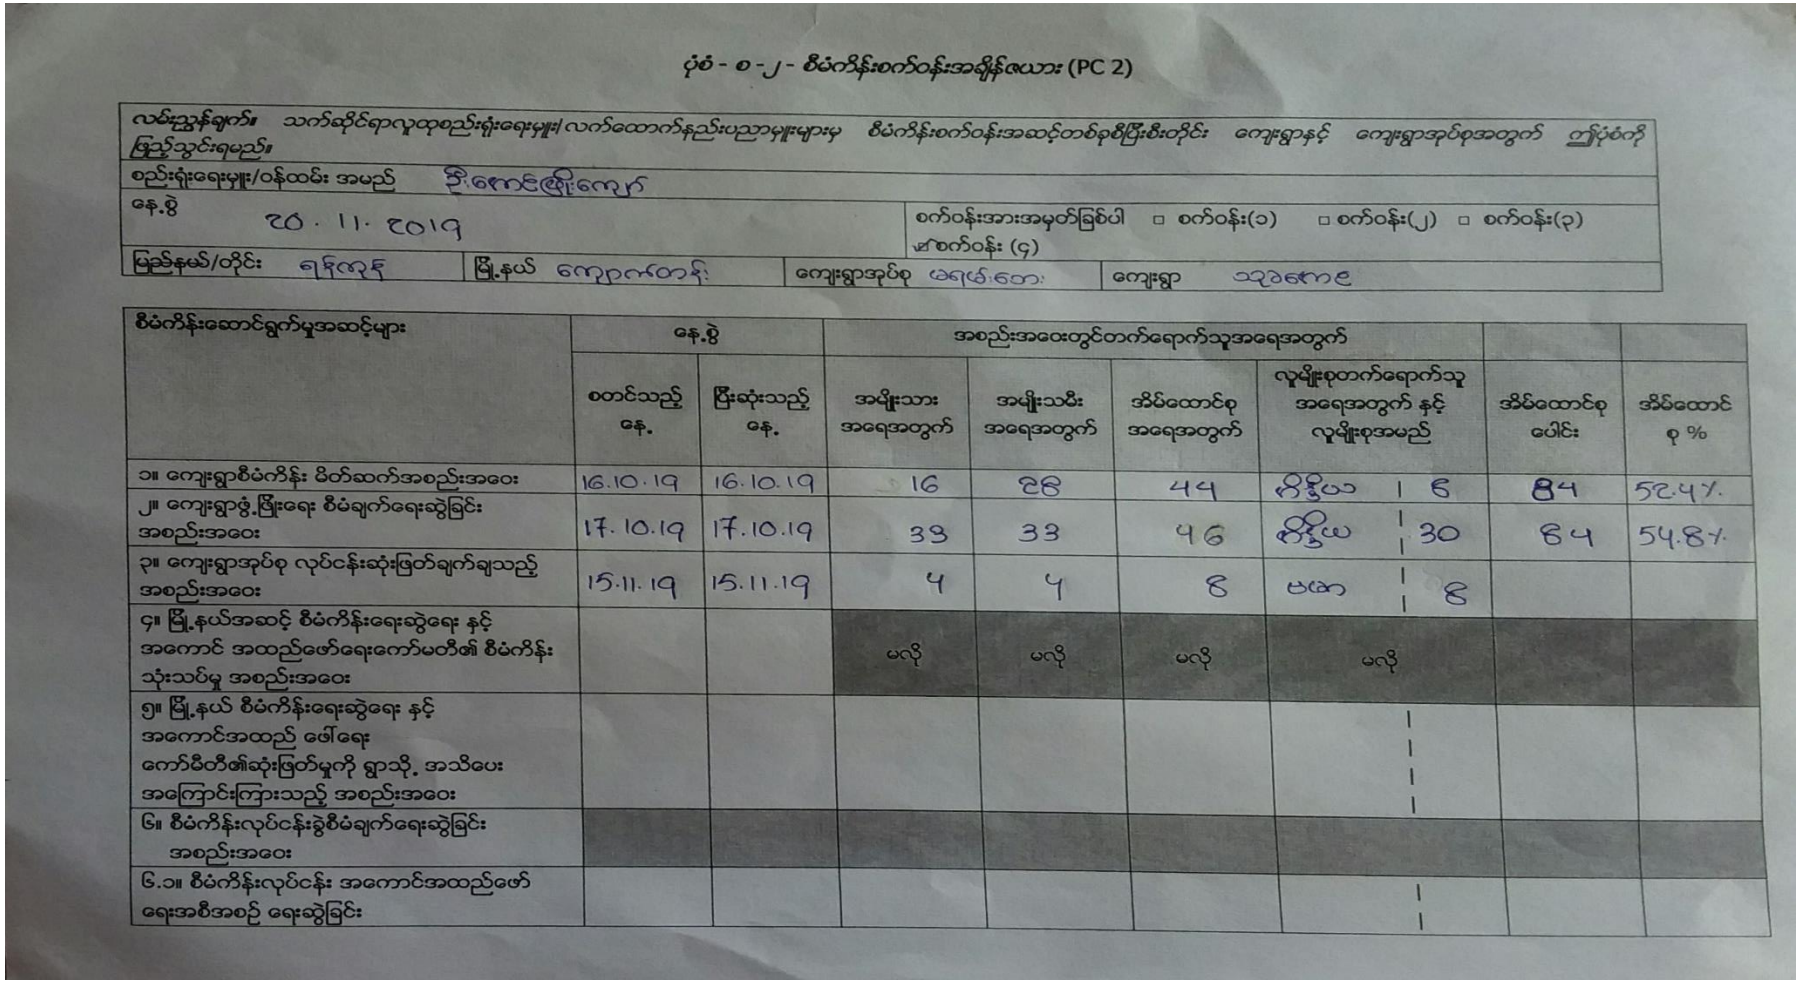

ပုံစံ - စ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောင်းကြိုးကျော်

နေ့စွဲ ၂၀.၁၁.၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) ☑ စက်ဝန်း (၃)

မြို့နယ်/တိုင်း ရန်ကုန် | မြို့နယ် ကျောက်တန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ပရဖိုးတော | ကျေးရွာ သဉ္ဇရောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့.	ပြီးဆုံးသည့် နေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.10.19	16.10.19	16	၉၆	၄၄	ကရင် ၆	၈၄	52.4%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.10.19	17.10.19	33	33	46	ကရင် 30	၈၄	54.8%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	15.11.19	15.11.19	၄	၄	၈	ပအို ၈		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာဖို့. အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

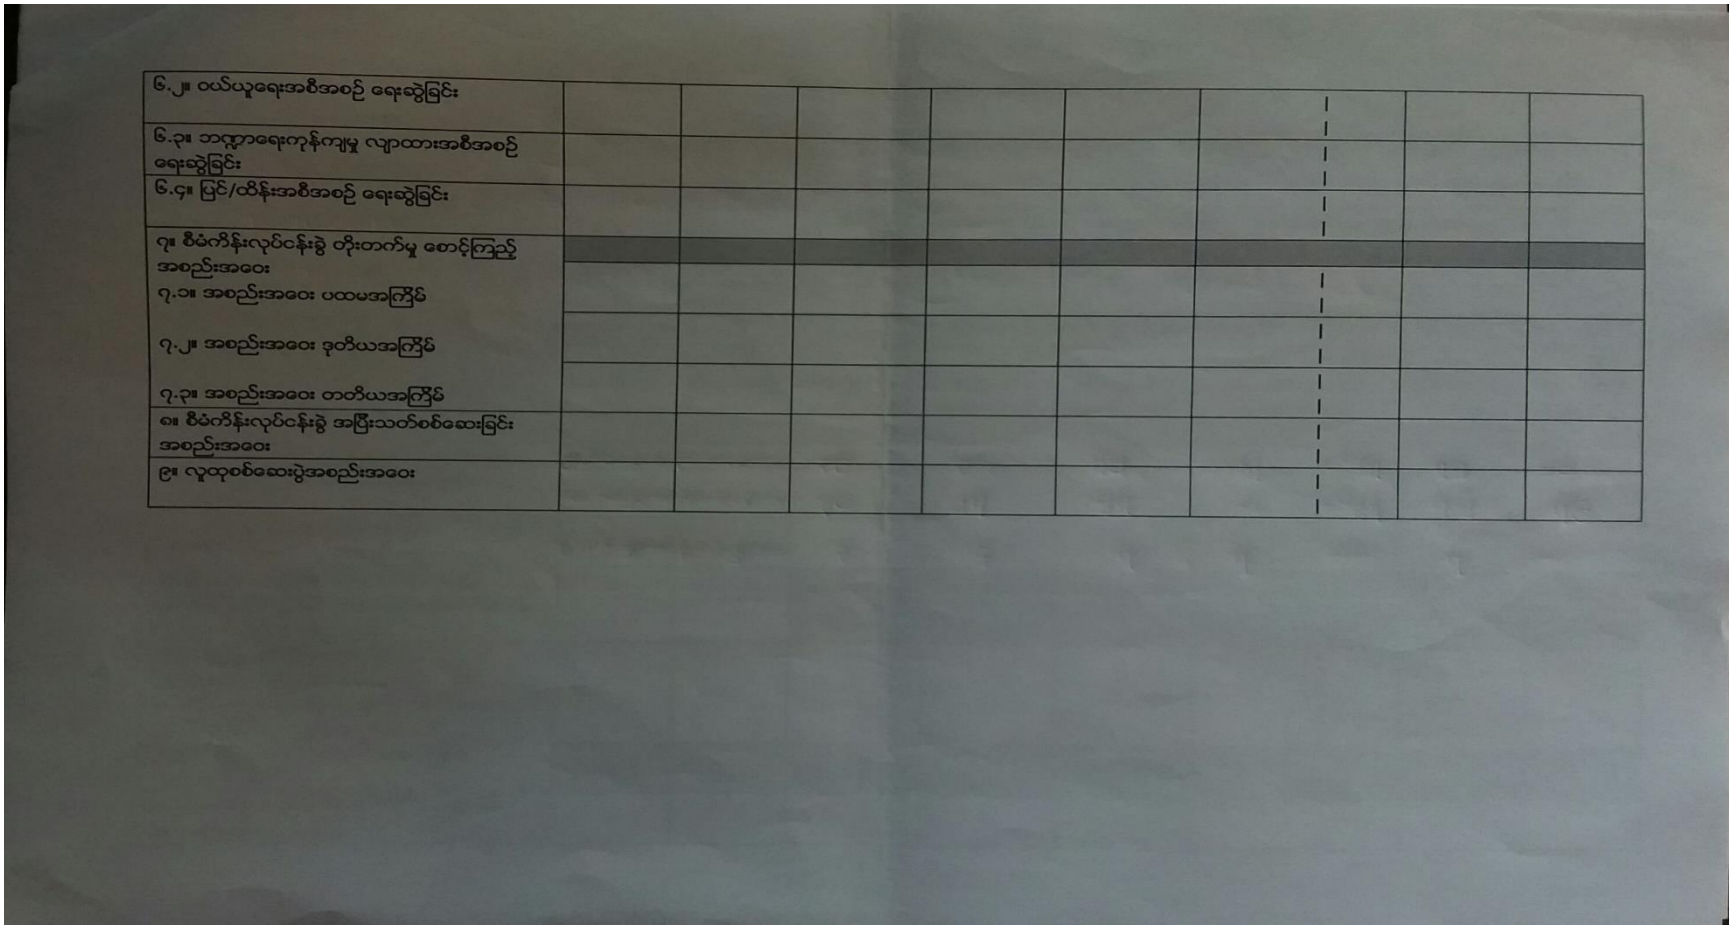

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၂။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးတိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကောင်းဖြိုး(ကျော်)
နေ့စွဲ 17.10.2019 / စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (√) □ စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂)□ စက်ဝန်း(၃)/စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ကျောက်တန်းမြို့နယ်	ဖရေဒ်(ဒေး)	၁၃၁၀ကွင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖေါ်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ကျား+မ
ရေသောက်ရေတွင် ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ကျန်းမာရေး ဖုန်ကောင်ပျန် ထေးကွာသောဆေးရုံဆေးခန်းများ အဝေးမှသွားရောက်ရသော ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းဟူသိတရုံသင်းခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ဥဘာက်သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
ကစည်းကမဲ့ပြဿနာ ရှုပ်ထွေးရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
သောက်သုံးရေ ဖာပ်လောက်ခြင်း	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+မ

၈။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များ	
လယ်ပင်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာအောင်-	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ရွာထဲကူးသန်းရေးလမ်းကောင်းလာအောင်	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
ကျန်းမာရေးဆေးရုံကောင်းလာအောင် ဆရာဝန်တိုးမြှင့်ပေးရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ကသိုလ်သာမပါသူတွေအတွက် အခြေခံပညာ ပြန်ဖွင့်ပေးရန်	□ ကျား □မ ☑ ကျား+ မ
ညဘက် သွားလာရေးလုံခြုံမှုရှိလာအောင်	□ ကျား ☑မ □ ကျား+ မ
စားသောက်ဆိုင်များဖွင့်လှစ်ရောင်းချခွင့်ပြုပေးရန်	☑ ကျား □မ □ ကျား+ မ
သောက်သုံးရေ ပုံမှန်ရရှိမှု ရှိလာအောင်	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ
	□ ကျား □မ □ ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖေါ်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	က + ဖ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	[illegible]	၁၇၅	၁၇၀	၃၄၅
၂	ကျေးရွာချောင်းကူးတံတား	က	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂	[illegible]	၁၇၅	၁၇၀	၃၄၅
၃	စာသင်ကျောင်းဖြုတ်ခြင်း	က + ခ	ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး	၃	[illegible]	၁၇၅	၁၇၀	၃၄၅
၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	က + ခ	ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေး	၄	[illegible]	၁၇၅	၁၇၀	၃၄၅
၅	စက်ရေတွင်း	က	ရေဝေးရေရေး	၅	[illegible]	၁၇၅	၁၇၀	၃၄၅

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၆	ကျေးရွာဓရံပေ	ပေ	စာရေးဝင် ဆောက်လုပ်ရေး	၄	၂၀၀၀၀၀	၁၅၅	၁၅၀	၃၀၅
၇	ကျေးရွာဆေးလေးဓရံး	က+ပ	စာရေးဝင် ဆောက်လုပ်ရေး	၇	၃၀၀၀၀၀	၁၅၅	၁၅၀	၃၀၅
၈								
၉								
၁၀								

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦးကွပ်ပျိုရေးဒုတိယဝဒ္ဒသပေး	က+ပ	စာသင်ဖွေ့ဝန်းကျောင်း
၂	စာသင်တန်းကျောင်းဧရိယာ	က+ပ	ပဒ္ဒသရေ
၃	စာရေးဂဒ္ဒီထောက်ပံ့ပေးရန်	က+ပ	စာသင်ဖွေ့ဝန်းကျောင်
၄	စာသင်ဖွေ့ဝန်းကျောင်သင်တန်း များပေးရန်	က+ပ	စာသင်ဖွေ့ဝန်းကျောင်
၅	ပဒ္ဒသရာ ဖြန့်တင်ရန်	က+ပ	ပဒ္ဒသရေ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခိုင်လွင် လက်မှတ် ခိုင် နေ့စွဲ 17.10.2019

၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

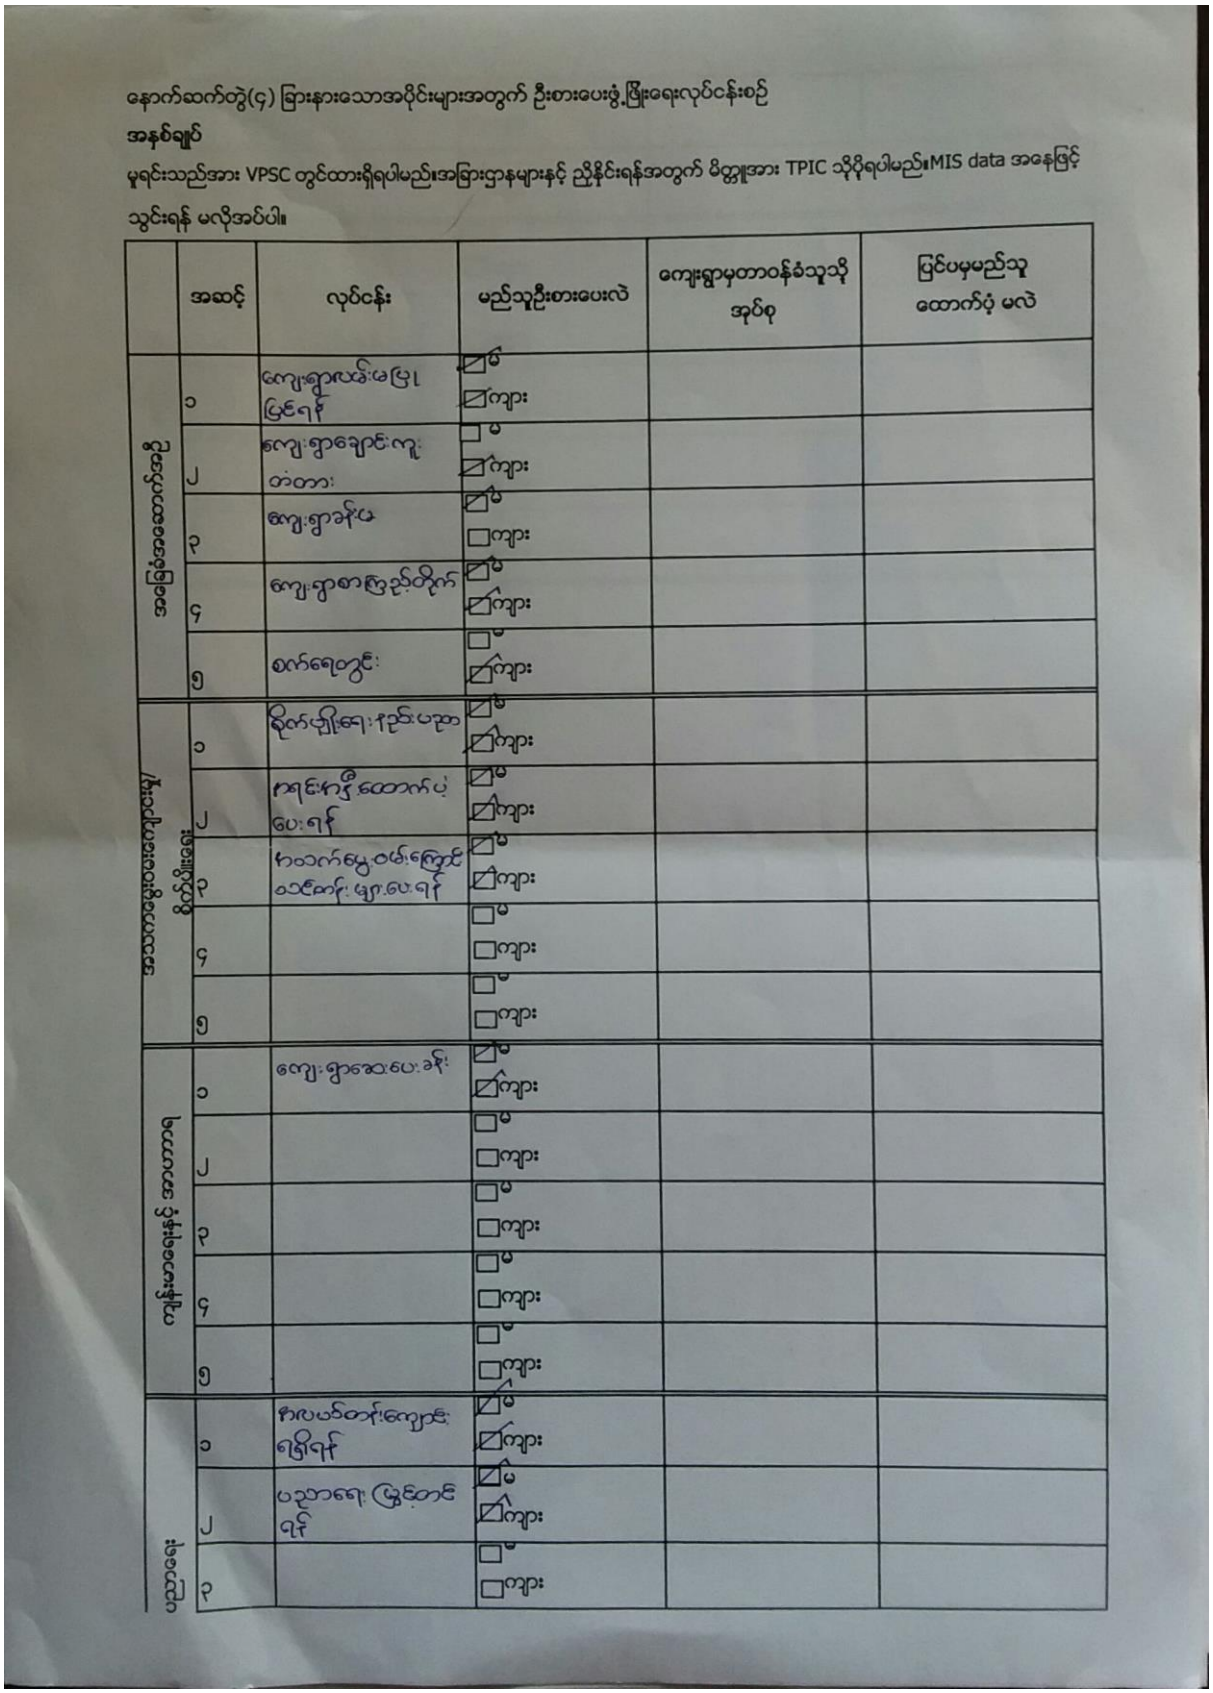

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဓိတ္တူအား TPIC သိုပို့ရပါမည်၊MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များ	၁	ကျေးရွာလမ်းမပြုပြင်ရန်	☑မ ☑ကျား		
	၂	ကျေးရွာချောင်းကူးတံတား	☐မ ☑ကျား		
	၃	ကျေးရွာခန်းပ	☑မ ☐ကျား		
	၄	ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတိုက်	☑မ ☑ကျား		
	၅	စက်ရေတွင်း	☐မ ☑ကျား		
ဖြည့်ဆည်းပေးရမည့်ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်များ	၁	ရိတ်ဟျိုးရော်ဒဲသီးပဲထွာ	☑မ ☑ကျား		
	၂	ကရင်းကဒီဆောက်ပဲပေးရန်	☑မ ☑ကျား		
	၃	ဟဝက်မြေဝမ်းကြောင်ဝင်ကုန်းမျှော်ပေးရန်	☑မ ☑ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
ဒေသဆိုင်ရာပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များ	၁	ကျေးရွာဆေးပေးခန်း	☑မ ☑ကျား		
	၂		☐မ ☐ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		
	၄		☐မ ☐ကျား		
	၅		☐မ ☐ကျား		
ဒေသခံပြည်သူများ	၁	ကာလမတ်တော်ကျောင်းရှိရှင်	☑မ ☑ကျား		
	၂	ပဥ္စသာရော ဖြန်တင်ရန်	☑မ ☑ကျား		
	၃		☐မ ☐ကျား		

အခြား	၁		□မ □ကျား		
	၂		□မ □ကျား		
	၃		□မ □ကျား		
	၄		□မ □ကျား		
	၅		□မ □ကျား		
	၆		□မ □ကျား		
	၇		□မ □ကျား		

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တန်းများ

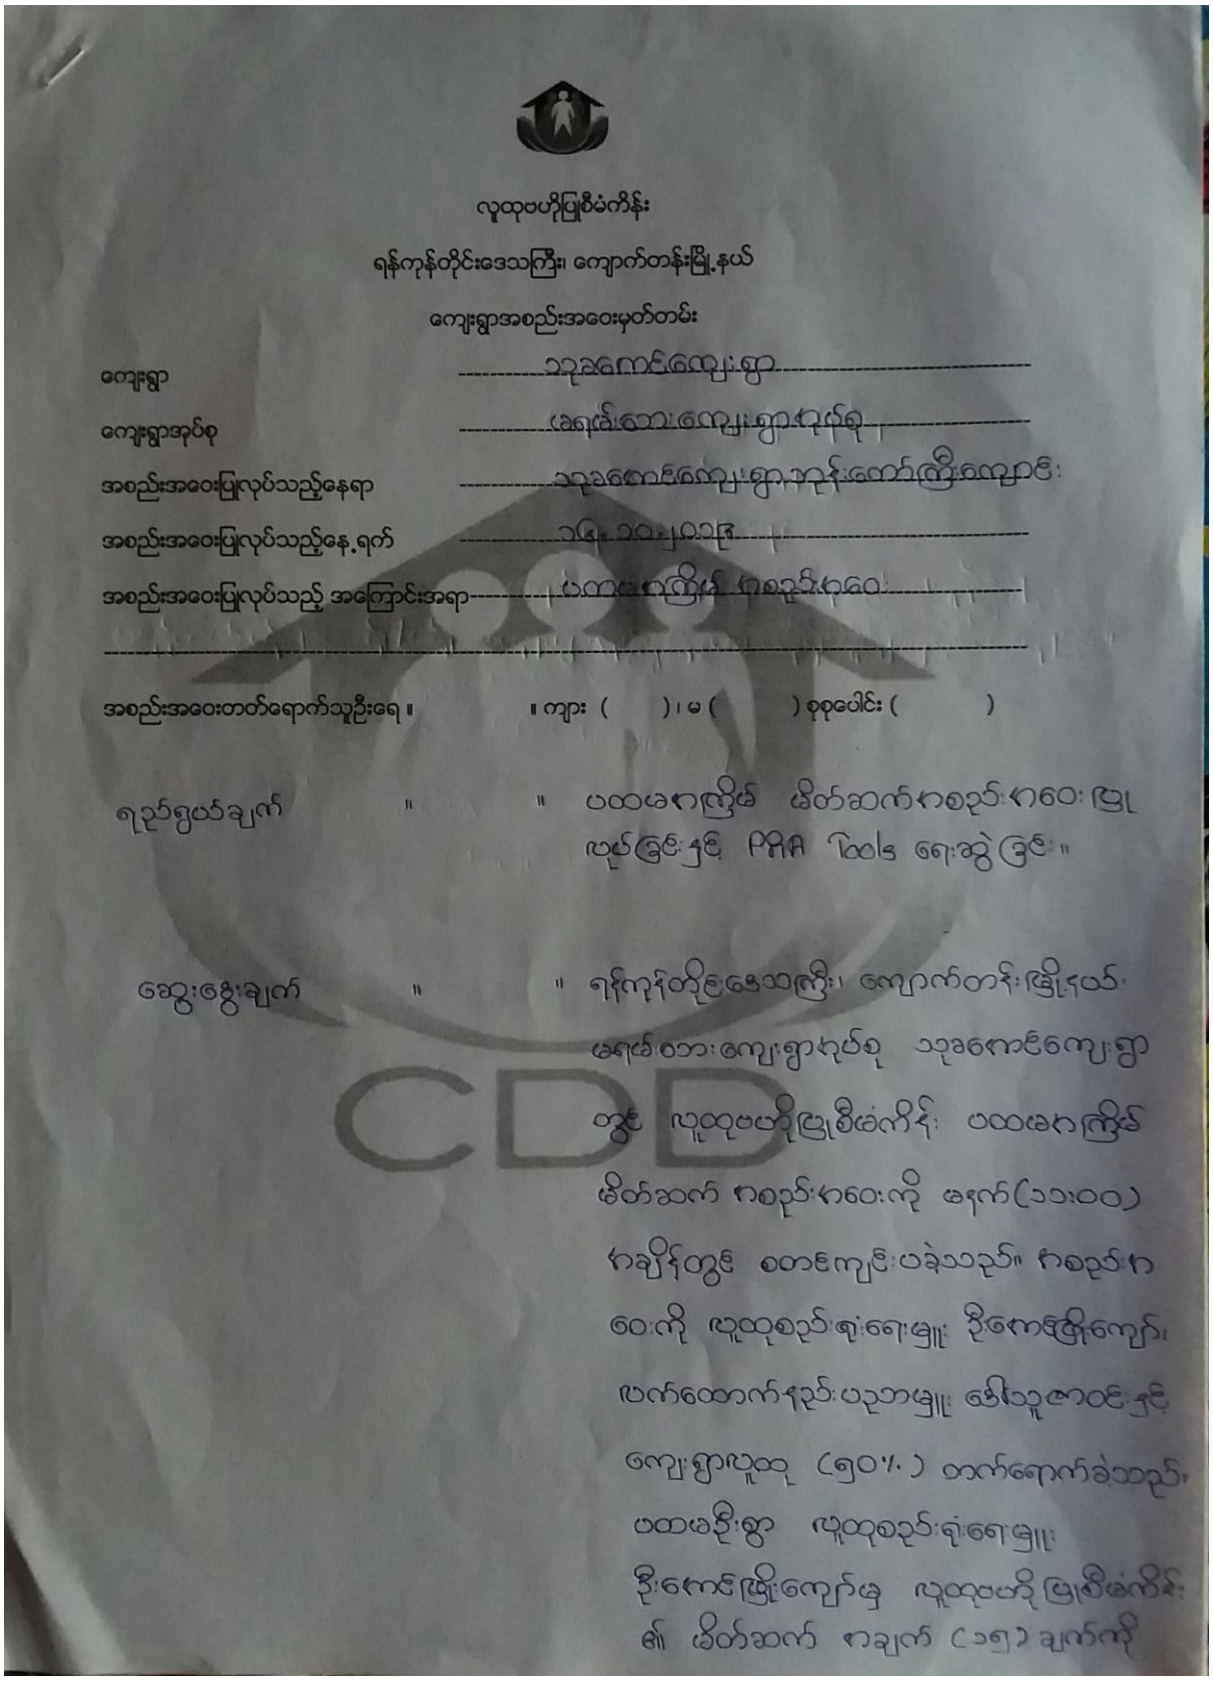

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ---------- သုခကောင်ကျေးရွာ ----------

ကျေးရွာအုပ်စု ---------- ဖရဖ်ဘေးကျေးရွာနုပ်စု ----------

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ---------- သုခကောင်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ---------- ၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ----------

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ---------- ပထဝနကြိမ် နစဉ်နဝေး ----------

---

အစည်းအဝေးတတ်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ) ၊ မ ( ) စုစုပေါင်း ( )

ရည်ရွယ်ချက် " " ပထဝနကြိမ် မိတ်ဆက်နစဉ်းနဝေးပြု ပုပ်ခြင်းနှင့် PRA Tools ရေးဆွဲခြင်း ။

ဆွေးဒွေးချက် " " ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ ဖရဖ်ဘေးကျေးရွာနုပ်စု သုခကောင်ကျေးရွာတွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ပထဝနကြိမ် မိတ်ဆက် နစဉ်းနဝေးကို ဖနက်(၁၁:၀၀) နချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ နစဉ်းနဝေးကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးကောင်ဖြိုးကျော်၊ ဃက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်သူဇာဝင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု (၅၀%) တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ပထဝဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးကောင်ဖြိုးကျော်မှ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ မိတ်ဆက် နချက် (၁၅) ချက်ကို

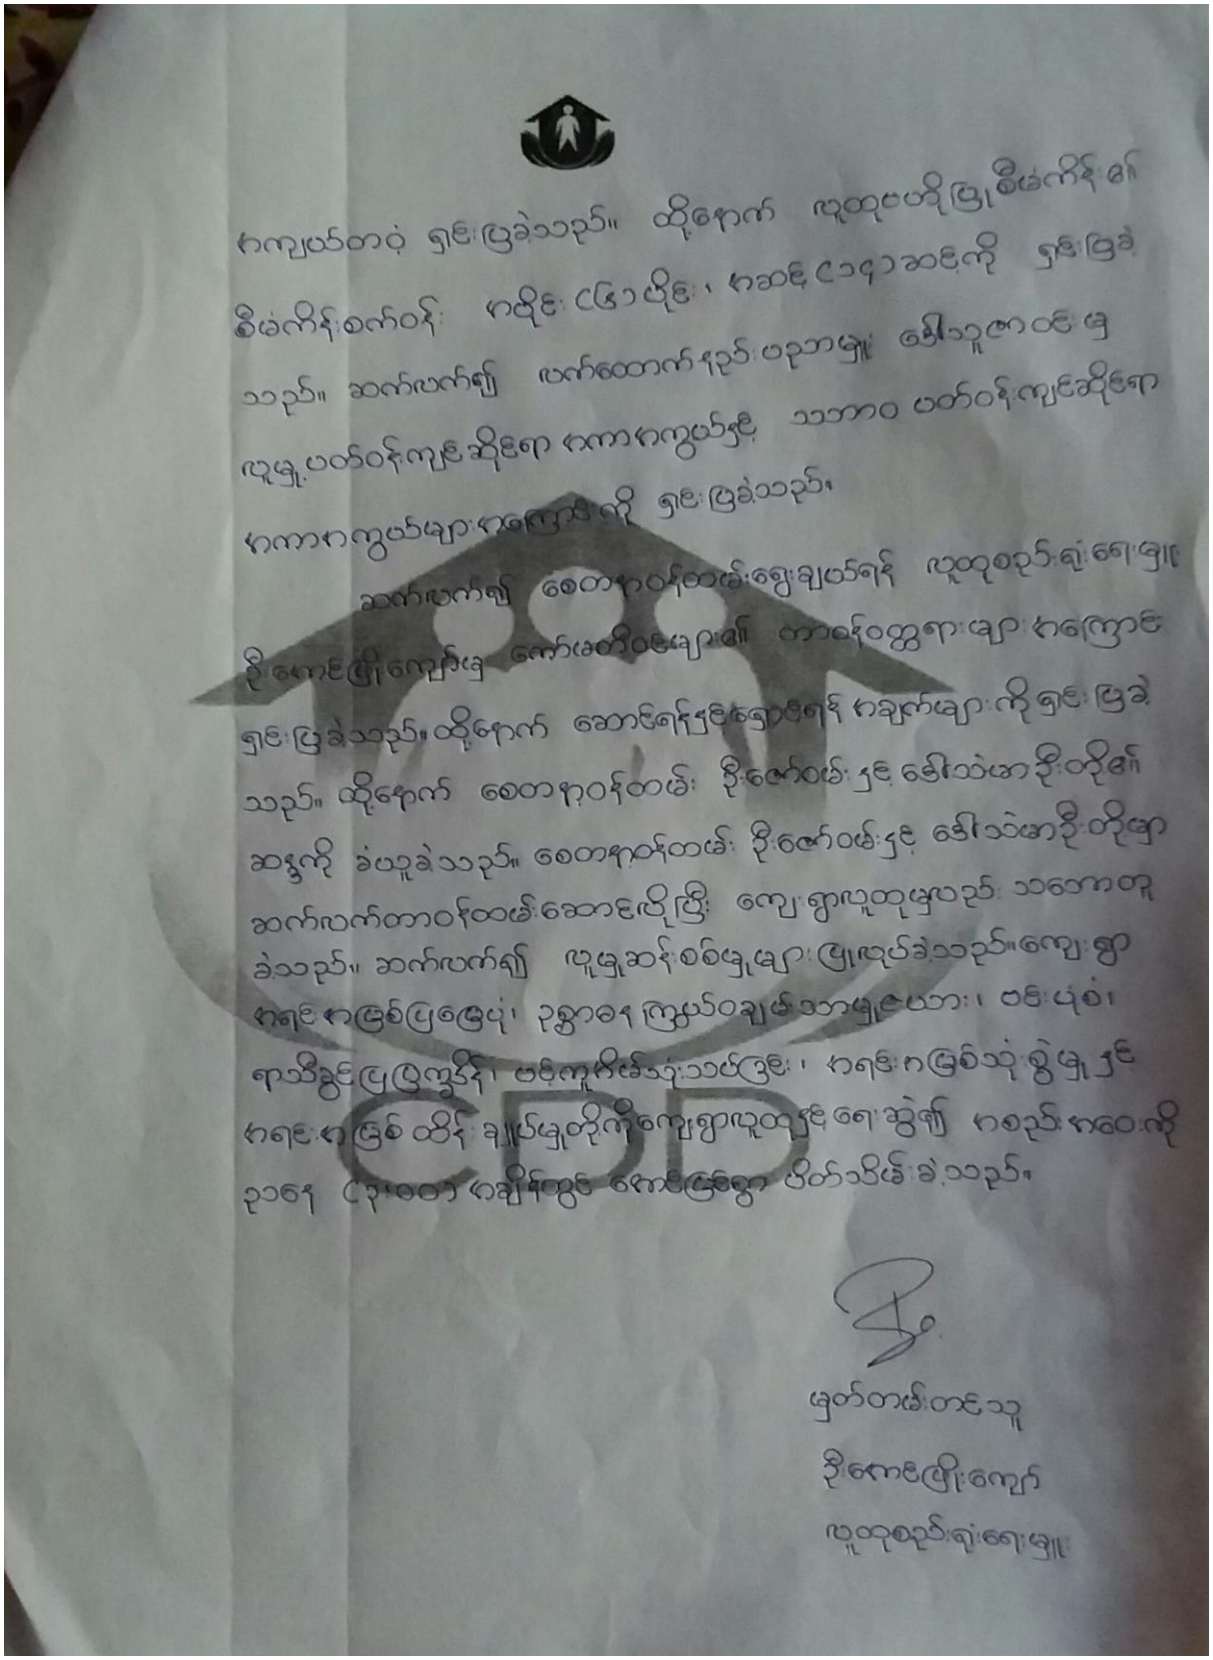

ကျယ်တဝံ့ ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူထုပတိုက်ဖြစ်စေကိန်းဂဏ်
စီမံကိန်းစက်ဝန်း ကထိုင် ငြိုးထိုင်း၊ ကဆင်ငသာဆင်ကို ရှင်းပြခဲ့
သည်။ ဆက်လက်၍ လက်ထောက်ရုံးပဒေသာမှူး ဒေါ်သူဇာဝင်းမြ
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကကျယ်ရှင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ကကျယ်များကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်၊

ဆက်လက်၍ စတေးဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
ဦးကောင်းကြီးကျော်မြ ကော်ဇော်ဝင်းမြ၏ ကာဒင်္ဂဏ်းများ ကိုရှင်းပြခဲ့
သည်။ ထို့နောက် စတေးဝန်ထမ်း ဦးကော်ဝင်း၌ ဒေါ်သဲအာဦးတို့၏
ဆန္ဒကို ခံယူခဲ့သည်။ စတေးဝန်ထမ်း ဦးကော်ဝင်း၌ ဒေါ်သဲအာဦးတို့မှာ
ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပို့ကြို ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူ
ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ လူမှုဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ကျေးရွာ
ကရင်းကဖြစ်ပြဿနာ၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှုန်းသာ၊ ပဒေသရာ
ဘာသိခွင်ပြဿနာ၊ ပဒေသကိန်းသုံးသပ်ခြင်း၊ ကရင်းကဖြစ်သုံ့စွဲမှု၌
ကရင်းကဖြစ်ထိခိုက်မှုတို့ကို ကျေးရွာလူထုဌာနီးရေးဆွဲ၍ ကစည်းကဝေးကို
ဥဒေါ်ရေ ငဦးစော ကချိန်းကွပ် ကောင်းစွမ်းစွာ ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

ဖြတ်တမ်းတင်သူ
ဦးကောင်းကြီးကျော်
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ----------သဉ္ဇကောင်----------

ကျေးရွာအုပ်စု ----------ပေါက်ဆော်----------

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ----------သဉ္ဇကောင်ကျေးရွာ သုံးတောက်ကြီးကျောင်း----------

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ----------၁၇.၁၁.၂၀၁၉----------

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ----------ပိတောက်ပန်းလမ်းသစ်ဖွင့်ပွဲ----------

---

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ) ၊ မ ( ) စုစုပေါင်း ( )

ဦးသိန်းဝင်းမျိုး ။ PRA Tool ၊ မျှော်မှန်းချက်ပြုခြင်း၊ ကော်မတီမျှော်မြွေးချယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆွဲ မျှော်မှန်းချက်ပြုပြင်ခြင်း။

ဆွေးနွေးသူများ ။ ။ ဒေါက်ထောက်နှုတ်ယုတ်မှု၊ ဒေါ်သူဇာဝင်း၊ ပုဇွန်ဖားကြီးမိုး၊ ဟာသုံး၊ ဟာဆေးတွင်ကျော်ဆွဲထား၊ စသော PRA Tool ၊ မျှော်မှန်းချက်ပြုပါသည်။ လူထုစုဝေး၊ ဦးစားပေး၊ မျှော်မှန်းချက်ပြုပြင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာတွက်ဆောင်ရွက်ထားမှုများကိုသေချာစွာကြည့်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ ကျောင်းပြင်များကို လုပ်ငန်းကြည့်ခဲ့ပါသည်။ စီးထဲကတက်ကော်မတီများခြေးပျဉ်ရာတွင် ဦးဆိုလျှင် ၊ ဒေါ်ဇော်အောင်မိုးတို့မှာဆက်ဟက်တာရိတမီးဆောင်ကြီး၊ ဝယ်ယူရာတွင်ဦးဖြစ်မှုင်၊ ဦးဖြစ်သော်ငြင့် ဒေါ်ရေးမှုင်တို့မှာယခုဒီးဆက်ဟက်တာရိတမီးဆောင်မှုခံဟုဆိုခဲ့ပါသည်။ ဝေဖုံမှာကြုံတွေ့ဆဲတွင်ဦး ဖြင့်ရေ ငြင့် ဒေါ်ရေးစသည်

ကို ဟာယဆုပ်၊ ဇာတ်ကြီးလဲမှ မရှိဘဲ ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ကြိုး စဉ်ပမတ်
တိုင်းသိမ်းရာ [illegible] တိတိကျကျပြီး ဖျိုဖေဝေး ဒဉ်ဒေါ်စေ၊
ဦးသုခ ကြိုးစဉ်တာရှိထမ်း ဆောင်ရွယ်ပဲဟု ဟတုဒဿိဖြင့် ပါသည်။
စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြို ကြာပါရော၊ ကော်မတီတွင်ပြီ၊ ဝင်ထွက်၊ ဒေါ်တစ်အော်
တို့ဟာ ဆုတ်ယုတ်စိတ်ဝင်၊ ဟတ္ထက် ဆက်လက်တာရှိထမ်း ဆောင်ဖော် ယူပါ
ဟုဟတုဒဿိဖြင့်ခဲ့ပါသည်။ စာရေးကိုဇ [illegible] ဒေါ်တင်အောန္တ။ သည်ဟုဆဉ်း
ဆက်လက်တာရှိထမ်း ဆောင်ဖော် ယူပဲဟု ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးချက်များ။

။ ကျပ်ငါးခဲ့ပျား ရှိသည်ကို ဘတ္တာကဏ္ဍတွင် ကောက်ထောက်ခံနည်းယူသာ ဖျို၊
ဒေါ်ယုကာထမ်းမှ ဟာကျို၊ ထိုလောဆဲကျပ်ငါးခဲ့ပျား ဒဉ်ဟာကျို၊ မထိသောကျပ်ငါးခဲ့
ပျားကို ဒုဂ်းဖြဲကြိုးဟာကာဟာကွယ်ပျား ကိုယူသည်ဟု ဒုဂ်းကြခဲ့ပါသည်။
စတုတ္ထဒဿိဆက်ရှိ ဟတ္ထက်ကျပ်ငါးခဲ့ပျားမှာ ၎ကျေးရွာတွင်းရပ်ဖြစ်၊ ၎ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
တစ်ဦးဦးဆောက်လုပ်ခြင်း ၎ဟာသဒ္ဓေကြောင့် ဖျက်ဖြစ်ခြင်း
၎ကျေးရွာဆောက်လုပ်ပိုက်ဆံဦးဆောက်လုပ်ခြင်း ၎ကျေးရွာ စက်ရေတွင်း
တူးဖော်ခြင်း ၎ကျေးရွာအုံ့ဖတ်ဦးဆောက်လုပ်ခြင်း ၎ကျေးရွာ
ဆေးစင်အုံ့တည်ဆောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ဟတ္ထက်ပါ
အွေးနွေးချက်များကို ကျေးရွာလူထုဖြဿဒေတာဥဒ္ဓိ၍ နွားရေ
၎ဘဝဒေသတွင်း ဟစည်းဟဆေးတက်သိမ်းခဲ့သည်။

ဖျက်တင်းတန်သူ

ဦးကောင်းကြီးကျော်

လူထုစည်းရုံးရေးဖျို

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ကျေးရွာ- VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း
  (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၊
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
  (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၊
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ မရမ်းဘေးကျေးရွာအုပ်စု၊ သုခအောင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း(VDP)ဖြင့်ဆောင်ရွက်လိုသောဦးစားပေးလုပ်ငန်း

စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အတိုင်းအတာ	မှတ်ချက်
၁	မရမ်းဘေး	သုခအောင်	-ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း -ကွန်ကရစ်တံတား	-(၃၈၀'x၃' x ၆")	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်း (VDP) ကော်မတီဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အဖအမည်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကော်မတီတာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဝင်းထွန်း	ဦးသံခဲ	၁၂/တတထ(နိုင်)၀၀၁၃၂၆	ဥက္ကဋ္ဌ (ချက်)	09-762256830	
၂	ဦးမျိုးမြင့်	ဦးတင်ငွေ	၁၂/ကတန(နိုင်)၀၅၇၄၄၀	ဘဏ္ဍာရေးမှူး(ချက်)	09-764268591	
၃	ဦးမြင့်ဇော်	ဦးအောင်သိန်း	၁၂/ကတန(နိုင်)၀၆၁၂၄၃	ဝယ်ယူရေး	09-753246944	
၄	ဦးခိုင်လွင်	ဦးသန်းမြင့်	၁၂/တတထ(နိုင်)၀၀၁၃၀	အတွင်းရေးမှူး	09-768983153	
၅	ဒေါ်တင်ဇာကြူ	ဦးငြိမ်းရွှေ	၁၂/တတထ(နိုင်)၀၀၁၄၃၅	စာရင်းကိုင်	09-764624285	
၆	ဒေါ်နှင်းရီ	ဦးငွေထွန်း	-	အဖွဲ့ဝင်(ချက်)	09-763870698	
၇	ဒေါ်ဇင်မာသိမ့်	ဦးသန်းလွင်	၁၂/တတထ(နိုင်)၀၁၀၈၆၆	အဖွဲ့ဝင်	09-776288505	
